ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

TANÚSÍTVÁNY

ÉMI-TÜV

Az **ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft.**
(H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)
mint az BFKH által MFO-83 számon kijelölt szervezet jelen tanúsítványt
a 24/2020. (VII.3.) ITM rendelet előírásai alapján állította ki.

A tanúsítvány száma:	T-41-M1736
Revízió szám:	1.0

A berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, szórakozási célú sporteszköz adatai:	
Megnevezés (típus/fantázianév):	„C" típusú sportpark
Gyártó neve:	KATKER 2005 Kft.
Gyártó címe:	H-4027 Debrecen, Füredi u. 49-51.
Kivitelező neve:	VELTECH Kft.
Kivitelező címe:	H-2458 Kulcs, Kossuth Lajos utca 3.
Azonosítószám/ jelzet:	H-6086 Szalkszentmárton község, 934/1. hrsz.
Gyártás/ kivitelezés időpontja:	2020.01.
Veszélyességi osztály:	III. veszélyességi osztály
Terhelhetőség/ főbb korlátozások:	- 1 fő / eszköz - 140 cm testmagasság felett használható - maximális testtömeg: 99 kg

A műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos adatok:	
Értékelés műszaki alapját képző hivatkozás:	MSZ EN 16630:2015
Értékelő jegyzőkönyv száma:	T-41-M1736/24

Üzemeltetői adatok:

Név	Cím/ székhely	Engedélyszám	Jóváhagyás
Szalkszentmárton Község Önkormányzata	H- 6086 Szalkszentmárton, Jókai utca 2.	Adószám: 15724533-2-03	2024.02.12. Kotró Tamás

Üzemeltetési napló száma:	ITM rendelet szerint nem szükséges szórakozási célú sporteszközökre, de az üzemeltető feladata a rendszeres ellenőrzések, a folyamatos karbantartás elvégzése és a munkák dokumentálása.

A tanúsítvánnyal kapcsolatos adatok:	
Az első használatbavétel előtti műszaki ellenőrzés időpontja:	2020.02.
A legutóbbi időszakos ellenőrzés időpontja:	2024. február 5.
A tanúsítvány lejártának hatálya:	2027. február 5.

Az üzemeltetés során a vonatkozó balesetvédelmi előírásokat, a biztonságos üzemeltetés garantálása végett előírt jogszabályokat be kell tartani. Megállapításaink az ellenőrzés időpontjára érvényesek, két ellenőrzés között a berendezés/létesítmény megfelelő állapotának folyamatos biztosítása üzemeltetői felelősség.
A tanúsítvány a kiadott Értékelő jegyzőkönyvvel együtt kezelendő és az abban foglaltak betartása mellett érvényes.

Az értékelési folyamat átvizsgálását követően a tanúsítványt kiállítom.

Szentendre, 2024. február 12.

ÉMI-TÜV SÜD Kft.

Kotró Tamás
tanúsító szakértő
ÉMI TÜV SÜD Kft.

TÜV®

ÉMI-TÜV

ÉRTÉKELŐ JEGYZŐKÖNYV

Szórakoztatási célú berendezés, létesítmény és ideiglenes szerkezet, valamint szórakozási célú sporteszköz 24/2020. (VII.3.) ITM rendelet szerinti időszakos műszaki ellenőrzéséhez

I. A berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, szórakozási célú sporteszköz alapadatai:	
Megnevezés (típus/fantázianév):	„C" típusú sportpark
Gyártó neve:	KATKER 2005 Kft.
Gyártó címe:	H-4027 Debrecen, Füredi u. 49-51.
Kivitelező neve:	VELTECH Kft.
Kivitelező címe:	H-2458 Kulcs, Kossuth Lajos utca 3.
Azonosítószám/ jelzet:	H-6086 Szalkszentmárton község, 934/1. hrsz.
Gyártás/ kivitelezés időpontja:	2020.01.
Veszélyességi osztály:	III. veszélyességi osztály

II. Tervellenőrzéssel kapcsolatos adatok:	
Az előző ellenőrzés óta a vonatkozó szabvány változott:	nem
Tervdokumentáció felülvizsgálata szükséges:	nem
Megjegyzések:	
A tárgyi sportpark biztonságosságáról T-41-J007/2/20 témaszámon adtunk ki jegyzőkönyvet 2020.02.04-én. A telepítés idején az eszközök és az ütéscsillapító gumilapok is rendelkeztek a vonatkozó termékszabványok szerinti tanúsítvánnyal.	

III. Üzemeltetéssel kapcsolatos adatok:	
A berendezések baleset Üzemeltető nyilatkozata alapján az előző ellenőrzés óta történt:	nem igazolták írásban
Üzemeltetői kockázatelemzés rendelkezésre áll:	nem, pótolni szükséges
Üzemeltetői kockázatelemzést az előző ellenőrzés óta aktualizálták:	nem
Karbantartási napló vezetése rendszeres:	nem, ellenőrzési naplót vezettek
Ütemezett karbantartást a berendezésen az előző ellenőrzés óta végeztek:	nem igazolták
Ha igen, a jegyzőkönyv azonosítója:	
Eseti felújítást az előző ellenőrzés óta végeztek:	nem
Megjegyzések:	
A kültéri fitnesz eszközöket a gyártó leírása szerinti rendszerességgel és részletességgel szükséges ellenőrizni és karbantartani. Az elvégzett (ellenőrzést és) karbantartást visszakövethető módon dokumentálni kell a jövőben. Az Üzemeltetőnek kockázatelemzést kell készítenie, melyre jó kiindulási alap a gyártó által készített elemzés.	

ÉMI-TÜV

IV. Helyszíni ellenőrzés adatai:	
Szemrevételezéses ellenőrzést végezte:	Kovács Dávid
Ellenőrzés időpontja:	2024. február 5., hétfő
Ellenőrzés helyszíne (település):	H-6086 Szalkszentmárton község, 934/1. hrsz.
Ellenőrzés alapját képző szabvány:	MSZ EN 16630:2015
IV./1.- Azonosítás és elhelyezés ellenőrzése:	
Főbb geometriai jellemzők tervszerintiek:	igen
Főbb szerkezeti elemek megtalálhatók:	igen
IV./2.- Stabilitás biztosításának ellenőrzése:	
Stabilizálás módja:	eszközök mechanikai rögzítése alaptestekhez
IV./3.- Szerkezeti elemek ellenőrzése:	
Általános deformációs állapot:	megfelelő
Általános korróziós állapot:	részlegesen megállapítható
IV./4.- Egyéb rész-egységekre vonatkozó ellenőrzés- termékszabvány szerint:	
Felhasznált alapanyag szempontjából megfelelő	igen
Csavarvégek burkolása megfelelő:	igen
Élek lekerekítése megfelelő (r > 3 mm)	igen
Csúszásmentes felület megfelelő:	igen
Mozgó részek ellenőrzése:	nincs mozgó rész
- nyírási rész nem található:	
- szabad távolság a mozdulatlan elemtől megfelelő:	
- szabadon forgó alkatrészek (lendkerék) fékberendezése megfelelő:	
- Végütköző állapota megfelelő:	
Beszorulási helyek (fej, nyak, ujj, láb) szempontjából megfelel:	igen
Edzősúly / ellenállás szabályozása megfelelő:	igen
Beszállás és kiszállás biztosított:	igen
Kopó alkatrészek cserélhetősége biztosított:	igen
Megfogás (<80 mm), és Körülfogás (<45 mm) megfelelő:	igen
Kötelek, láncok kialakítása megfelelő:	nincs
Edzési tér biztosított:	igen
Mozgási tér biztosított:	igen
Maximális esési magasság megfelel az ütéscsillapító talaj kritikus esési magasságának:	igen (bordásfal: 2,04 m)
Ütéscsillapító talaj típusa:	gumilap 50×50×6,0 cm - KAT-GT1-60/15 (HIC=2,1 m)
Alapozás kialakítása megfelelő:	igen
Járófelület egyenletes:	igen
Használati utasítás és felhasználói korlátozások kifüggesztve:	részben, lásd IV./5. fejezet megjegyzése
Megjelölés a szabvány 8. pontja alapján	igen

ÉMI-TÜV

IV./5.- Helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos megjegyzések:

Az üzemeltető feladata a környezet tereprendezésének fenntartása és a mozgási (esési) terek karbantartása. A sportpark burkolata mellett a talajt azzal egy síkba kell feltölteni, lokális talajsüllyedés, kimosódás esetén a talajt pótolni szükséges.

A helyszíni szemle tapasztalatai alapján a sportpark környezete, az eszközök és a gumilap állapota alapvetően jó állapotú. Az információs táblák jól olvashatók.

Néhány elem (Fekvőtámasz elemek (4 db), hasizom erősítő (3 db), hátizom erősítő (2 db) nyitott csővég záró kupakja hiányzik, azok pótlása szükséges.

Kisebb festékkopások, használatból eredő karcok láthatóak egyes elemek felületén. Javasolt ezeket időben kezelni az elemek korróziójának és állapotromlásának elkerülése érdekében.

Az alapvető (tanúsítványon is szereplő) korlátozások nem voltak feltüntetve. Javasolt ezeket az F16 fotón látható, eszközöket szemléltető tábla fölött lévő, erre a célra kialakított részre kihelyezni.

A gumiburkolat és az eszközök (rendszeres) tisztítását szükséges elvégezni.

V. Felügyelt próbajárattal kapcsolatos adatok:

Próbaüzemmel kapcsolatos szabványkövetelmények teljesültek:	igen
Alkalmazott terhelés:	93 kg

VI. Berendezés kialakítását/ állapotát bemutató fotók:

F01- Általános nézet a lépegetők felől

F02- Általános nézet a kombinált húzódzkodó felől

F03- Általános nézet a has- és hátizom erősítő felől

F04- Általános nézet a dupla multifunkciós trénerek felől

ÉMI-TÜV

F05- Általános nézet az alacsony húzódzkodó-tolódzkodó felől

F06- Általános nézet az egyenes húzódzkodó felől

F07- Általános nézet a vízszintes hullám felől

F08- Általános nézet a bordásfal felől

F09- Fekvőtámasz elemek és lépegetők

F10- Fekvőtámasz elemek hiányzó nyitott csővég kupakjai

ÉMI-TÜV

F11- Hátizom erősítő hiányzó nyitott csővég lezáró kupakjai I.

F12- Hátizom erősítő hiányzó nyitott csővég lezáró kupakjai II.

F13- Hasizom erősítő hiányzó nyitott csővég lezáró kupakjai I.

F14- Hasizom erősítő hiányzó nyitott csővég lezáró kupakjai II.

F15- Központi Információs tábla I.

F16- Központi Információs tábla II.
(hiányzó korlátozások)

ÉMI-TÜV

VII. Értékelő szakértő összefoglaló megállapításai	
Az üzemeltetési dokumentáció	alapvetően megfelelő, de hiányos.
A berendezés általános állapota	tűrhető, kisebb javítások szükségesek.
A berendezés a szabvány követelményeit	kielégíti.
A berendezés tanúsítványának hosszabbítása	javasolt. A jelzett észrevételeknek megfelelő kisebb karbantartásszerű javításokról gondoskodni kell!

Általános megjegyzések, szükséges pótlások/javítások:

Az Üzemeltetőnek a 24/2020. (VII.3.) ITM rendeletben előírt üzemeltetői kockázatelemzést pótolni szükséges.
A (rendszeres) ellenőrzést és karbantartást dokumentumokkal igazoltan vezetni szükséges.

A sportparkot (eszközöket és gumiburkolatot) a szennyeződésektől rendszeresen tisztítani szükséges.

VIII. Mellékletek:	
M1 melléklet-	Telepítési alaprajz

A létesítményen esetlegesen bekövetkezett balesetekről a Kijelölt Szervezetet haladéktalanul értesíteni kell! A létesítmény állapotában és használhatóságában bekövetkező bármilyen változásról a Kijelölt Szervezetet tájékoztatni szükséges és a használatot azonnal be kell szüntetni. Baleseteket, káreseményeket (pl. viharkár) követően a létesítmény csak a független ellenőrzés sikeres eredménnyel történő megismétlését követően állítható újra üzembe.

Szentendre, 2024. február 12.

ÉMI-TÜV SÜD Kft.

Kovács Dávid
értékelő szakértő

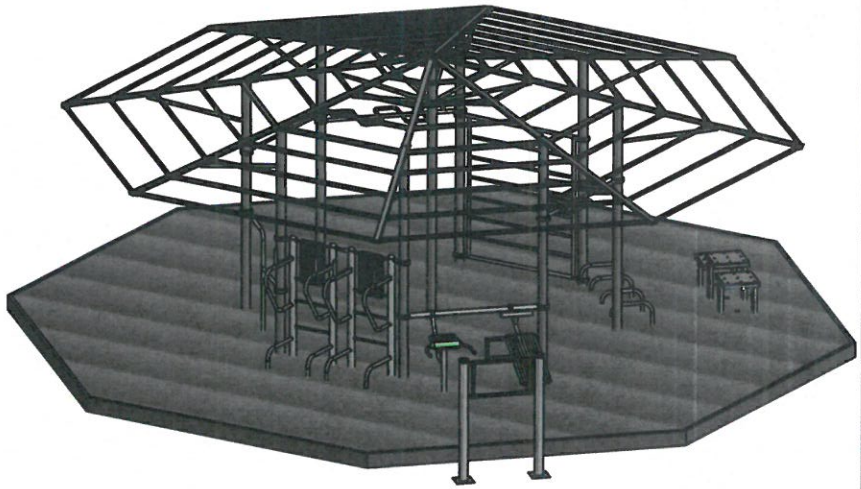

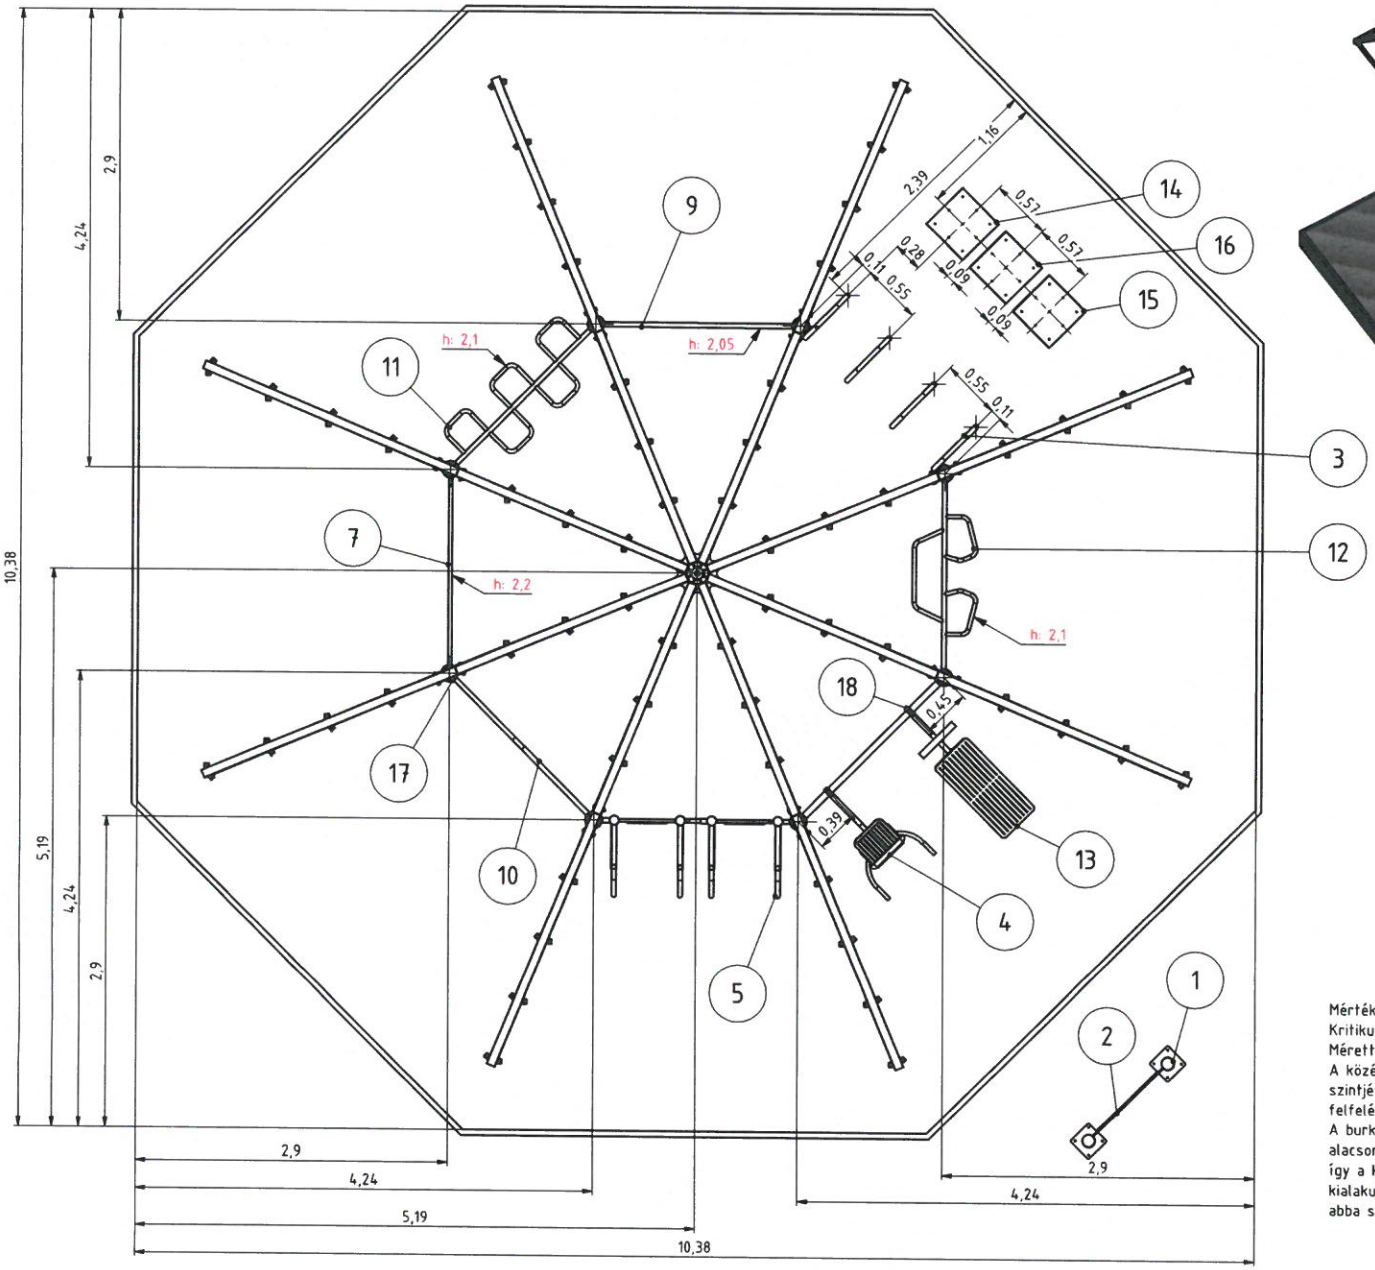

Ssz	Megnevezés	Darab
1	Információs tábla oszlop	2
2	Dupla keret	1
3	Fekvőtámasz korlát	4
4	Hátizom erősítő pad elem	1
5	Dupla multi tréner összeállítás	1
6	C típusú sportpark	1
7	Hegesztett rúd 1900	1
8	Hegesztett rúd 1900_60	1
9	Bordásfal 1900	1
10	Alacsony húzódzkodó tolódzkodó	1
11	Vízszintes hullám 1900	1
12	Kombinált húzódzkodó 1900	1
13	Hasizom erősítő pad elem	1
14	Lépegető 400 HDPE felület	1
15	Lépegető 500 HDPE felület	1
16	Lépegető 600 HDPE felület	1
17	Gyűrű fél (záró)	16
18	Gyűrű 60 fél (záró)	2

EMI-TÜV SÜD Kft.

Mértékegység [m]
Kritikus esésmagasság: HIC 2.1
Mérettűrés ±0.01 [m]
A középelemek magasságméretei gumitégla szintjétől bilincsközépig értendők, felfelé való eltérés TILOS!
A burkolt területen túllógó eséstér 1 méternél alacsonyabb HIC értékű eszközöknél fordul elő, így a környező területet a botlásveszély kialakulását mellőzve kell kialakítani, illetve abba semmilyen tárgy nem eshet.

KATKER 2005 KFT	BESTRONG KONDIPARK
Anyag/Material:	
Összeszerelési terv	2017. 09. 04.
Kondipark C típus	
